



**Landratsamt Ebersberg**

**Untere Naturschutzbehörde**


**Windkraft im LSG Ebersberger  
Forst;  
Bürgerentscheid vom 16.05.2021 -  
Einleitung weiterer  
Verfahrensschritte**

# Gliederung

- 1. Projektablauf grafisch**
- 2. Personalressourcen uNB**
- 3. Finanzielle Ressourcen**

# 1. Projektablauf

## Nutzung von Confluence zur Projektsteuerung

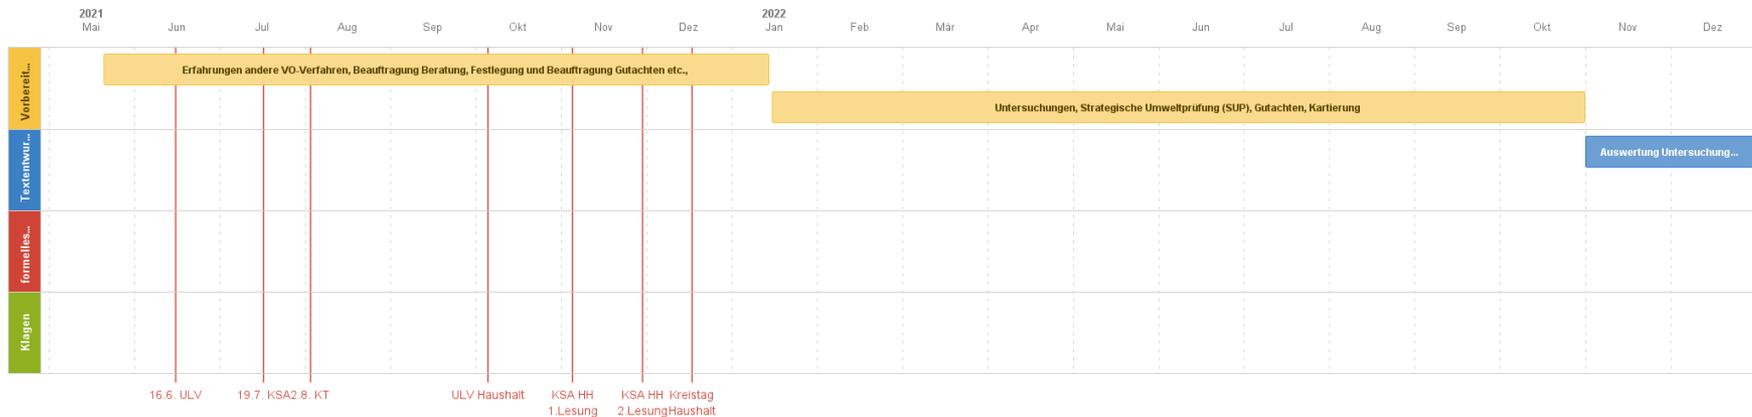

**Vorbereitende Arbeiten bis Jahresende 2021**

**Beauftragung und Untersuchungen im Jahr 2022**

**Auswertungen der Untersuchungen ab November 2022**



# Untersuchungszeitraum 2022

2022

Jan

Feb

Mär

Apr

Mai

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dez

Untersuchungen, Strategische Umweltprüfung (SUP), Gutachten, Kartierung

Auswertung Untersuchung...

## 2. Personalressourcen uNB

- **zahlreiche zusätzliche Tätigkeiten erforderlich, die derzeit nicht in den geplanten Jahresarbeitsstunden der uNB eingeplant sind**
- **Outsourcing auf externe Berater (juristischem und fachlichem)**
- **Dennoch umfangreiche Betreuung der externen Berater erforderlich (LV, Ausschreibung, Verwertung der Ergebnisse u.a.)**

## 2. Personalressourcen uNB

	anstehende Tätigkeiten	Erforderliche Stunden uNB geschätzt
0.	bisherige Tätigkeiten*	180
1.	Konzeptionelle Vor-Arbeiten:	270
2.	Konzeption zur Modifizierung	210
3.	Erarbeitung Verordnungsentwurf	300
4.	Vorlage in den Gremien (ULV, KT)	30
5.	Auslegungsverfahren	500
6.	Normenkontroll-/ Popularklagen	100
7.	Genehmigungsverfahren bei uIB	100
	<b>Summe</b>	<b>1690</b>

# Finanzielle Ressourcen

Im Zwischenbericht werden für

2021 30.000,- € und

2022 100.000,- €

als zusätzliche Mittel für Gutachten veranschlagt.

Eine zusätzliche Vollzeitstelle wird schnellstmöglich benötigt. Eine freie Stelle im Stellenplan steht nicht mehr zur Verfügung, eine andere Stelle könnte dann nicht besetzt werden.

Kosten einer VZ-Stelle: rd. 60.000 € Vollkosten/Jahr

Stelle soll einen sog. „KW-Vermerk“ erhalten

# Kostenbeteiligung

**Vereinbarung zur Beteiligung der Green City AG bzw. der Betreibergesellschaft an den Kosten zur Modifizierung des Landschaftsschutzgebiets:**

- **Sollten die Windräder genehmigt werden, wird die Betreibergesellschaft sämtliche Kosten zur Modifizierung des Landschaftsschutzgebietes übernehmen.**
- **Bei Nichtgenehmigung werden zukünftig anfallende Kosten zu 40 Prozent vom Landkreis und zu 60 Prozent von Green City getragen.**
- **Bisher angefallene Kosten trägt jede Partei selbst.**

**Vielen Dank  
für Ihre Aufmerksamkeit**

**Fragen?**
